

Financiamento





Execução









Robô para operação de stoplogs alagados

Pedido de Extensão Período: Oct/2013 a Fev/2015





Sumário

1	lder	ntificaA§A£0	3
2	Equ	ipe executora	4
3	Intr	odução	5
4	Cro	nograma	6
	4.1	Gerência	9
	4.2	Robô Submarino	10
	4.3	Sistemas de Superfície	11
5	Fina	nnceiro	13
	5.1	Desembolso	14
	5.2	Recursos humanos	15
	5.3	Serviços de terceiros	16
	5.4	Material de consumo	17
	5.5	Material permanente	18
	5.6	Viagens e diárias	19
	5.7	Outros	20
	5.8	Balanço	21
	59	Cronograma	22





1 Identificação

Título: ROSA - Robô para operação de *stoplogs* alagados

Proponente: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPE-

TEC)

Contratante: Energia Sustentável do Brasil S.A.

Execução: Grupo de Simulação e Controle em Automação e Robótica (GSCAR)

Contrato: Jirau 151/13

P&D ANEEL ...: 6631-0002/2013

COPPETEC ...: PEE 17.369

Início: 08 de Outubro de 2013

Prazo: 12 meses

Orçamento: R\$ 4.364.217,78

Coordenador ...: Ramon Romankevicius Costa

Gerente: Breno Bellinati de Carvalho

[10:35] 30 de junho de 2014





2 Equipe executora

Nome	Função	Qualificação	Instituição	CPF
Alana Monteiro	Auxiliar Adm.	SU	UFRJ	147.881.217-60
Alessandro Jacoud	Pesquisador	DO	UFRJ	028.503.687-41
André Figueiró	Pesquisador	SU	UFRJ	124.207.057-05
Eduardo Elael	Pesquisador	SU	UFRJ	045.287.677-08
Gabriel Alcântara	Pesquisador	SU	UFRJ	136.759.937-79
Júlia Campana	Pesquisador	SU	UFRJ	102.517.697-98
Patrick Paranhos	Pesquisador	MS	CIR	092.144.157-65
Ramon Romankevicius	Coordenador	DO	UFRJ	310.036.646-87
Renan Freitas	Pesquisador	SU	UFRJ	129.325.817-24





3 Introdução

Prezado Breno,

Gostariamos de requisitar a extensão de 5 meses no prazo para a execução do projeto ROSA, P&D ANEEL 6631-002/2013, seguindo o novo cronograma fÃsico-financeiro em anexo. Ressalto que a extensão não acarretarÃ; em nenhum custo adicional a ESBR. A razão para o pedido de extensão é que o projeto se encontra com 5 meses de atraso em sua execução, sendo as principais causas:

- Atraso no pagamento da primeira parcelas do projeto, devido a falha no alinhamento administrativo entre a ESBR e a fundação Coppetec, o projeto iniciado em 8 de Outubro de 2014 teve sua primeira parcela paga no dia ?? de Fevereiro de 2015.
- Atrasos administrativos na alocação da equipe de pesquisa, inÃcio de projeto 8 de Outubro 2013, equipe alocada 18 de Novembro de 2013.
- Sector de compras da fundação Coppetec entrou em processo de auditoria interna e permaneceu fechado entre os dias ?? a ??





4 Cronograma

Nesta secção será proposto uma versão atualisada do cronograma de execução do projeto ROSA. Este cronograma será comparado com o cronograma original, ressaltando-se as alterações no plano de execução e a razão para o mesmo.

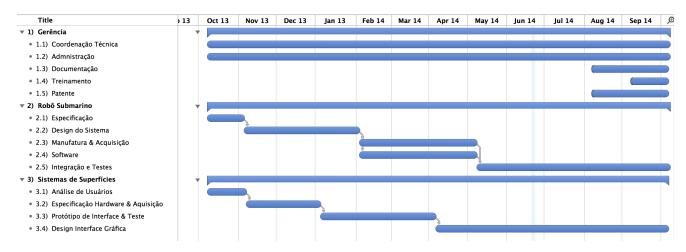


Figura 1: Gantt Original.

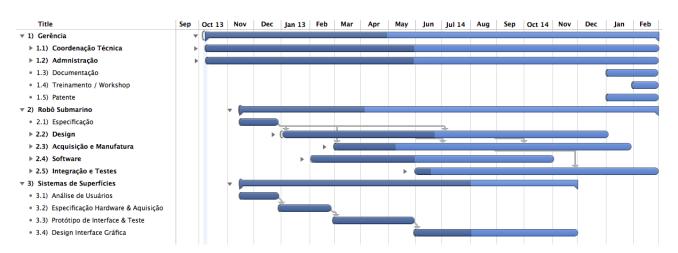


Figura 2: Gantt Atualisado.



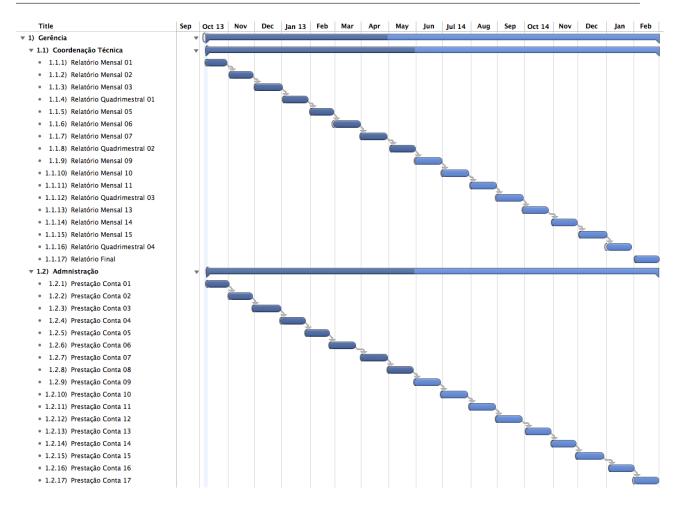


Figura 3: Gantt Detalhado Gerência.



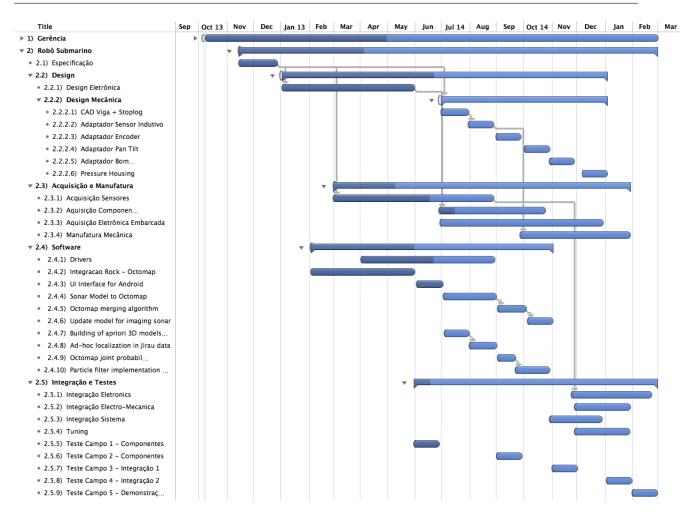


Figura 4: Gantt Detalhado Robô Submarino.





4.1 Gerência

- 1) Gerência: O planejamento tecnológico e administrativo, organização, coordenação e controle utilizados para alcançar os objetivos gerais do projeto, que não estão associados a hardware específico ou elementos de software.
- **1.1) Coordenação Técnica** : Coordenar a parte técnica do projeto, atribuindo tarefas e revendo o trabalho concluído.

Original - Início: Outubro 2013, Duração: 12 Meses

Atualizado - Início: Outubro 2014, Duração: 17 Meses

- Razão A extensão de 5 meses no plano de execução do projeto resulta na necessidade de se estender o tempo de duração da tarefa de coordenação técnica pelo mesmo período de tempo.
- **1.2) Administração** : Administrar a parte financeira do projeto.

Original - Início: Outubro 2013, Duração: 12 Meses

Atualizado - Início: Outubro 2014, Duração: 17 Meses

- Razão A extensão de 5 meses no plano de execução do projeto resulta na necessidade de se estender o tempo de duração da tarefa de administração pelo mesmo período de tempo.
- **1,3) Documentação:** Este pacote de trabalho lida com a escrita da documentação técnica e de operações.

Original - Início: Agosto 2014, Duração: 2 Meses

Atualizado - Início: Janeiro 2014, Duração: 2 Meses

- **Razão** O início da tarefa precisa ser postergada, pois a execução deste pacote de trabalho é dependente da conclusão da pesquisa do projeto que sofreu atrasos.
- **1,4) Treinamento:** Esforço necessário para treinar o pessoal de operação da hidrelétricas no uso do sistema robótico desenvolvido no projeto.

Original - Início: Setembro 2014, Duração: 1 Mês

Atualizado - Início: Fevereiro 2014, Duração: 1 Mês

- **Razão** O inicio da tarefa precisa ser postergada, pois a execução deste pacote de trabalho é dependente da conclusão da pesquisa do projeto que sofreu atrasos.
- **1,5) Patente:** Solicitação de patente de produto para o sistema robótico desenvolvido.

Original - Início: Agosto 2014, Duração: 2 Meses

Atualizado - Início: Janeiro 2014, Duração: 2 Meses

Razão - O início da tarefa precisa ser postergada, pois a execução deste pacote de trabalho é dependente da conclusão da pesquisa do projeto que sofreu atrasos.





4.2 Robô Submarino

- **2) Robô Submarino:** Este elemento lida com o trabalho necessário para desenvolver o sistema eletromecânico do robô.
- **2,1) Especificação:** Neste pacote de trabalho, requisitos do sistema serão especificados através de reuniões com os funcionários responsáveis pela operação na hidroelétrica e através de observações em campo. O resultado será um documento com os requisitos do sistema.

Original - Início: Outubro 2013, Duração: 1,5 Meses

Atualizado - Início: Novembro 2013, Duração: 1,5 Meses

Razão - Devido a atrasos administrativos internos, a equipe do projeto só foi contratada para trabalhar no projeto a partir do dia 18 de Novembro de 2013 o que resultou em um atraso equivalente para o início da execução do pacote de trabalho

2,2) Design do Sistema: Processo de definição da arquitetura, componentes, módulos e interface que satisfazem os requisitos do sistema.

Original - Início: Novembro 2013, Duração: 3 Meses

Atualizado - Início: Jan 2014, Duração: 12 Meses

Razão - A tarefa design é dependente da tarefa Especificação (item 2.1), logo a mesma sofre uma postergação na data de início. A tarefa design é composta por duas sub-tarefas: design eletrônica e design mecânica que eram para ser executadas em paralelo por um período de 3 meses.

Design Eletrônica O design da eletrônica sofreu uma alteração na duração para 6 meses. Pois, devido ao atraso no alinhamento admnistrativo, foi realizado 2 designs distintos da eletrônica ao invés do único design inicialmente planejado. O design extra considerou a construção de uma eletrônica com o equipamento emprestados de outros projetos do laboratório, o que permitiu a equipe de pesquisa seguir com as diversas tarefas dependentes da existência de uma eletrônica, como o teste de campo realizado no início de junho.

Design Mecânico O design da mecânica só será iniciado em Julho de 2014 e a duração será de 6 meses. Pois, não foi possível encontrar um engenheiro mecânico com interesse e conhecimento em robótica para ser parte da equipe de pesquisa do projeto, logo foi necessário contratar o serviço terceiro de Design Mecânico. Entretanto, o processo de contratação só se deu início após o problema de alinhamento administrativo do projeto ter sido resolvido, o que resultou no início da sub-tarefa apenas em Julho 2014. A alteração no prazo de duração da tarefa reflete a proposta da empresa contratada para a execução do serviço.

2,3) Manufatura e Aquisição: Compra e construção dos componentes definidos durante a fase de design do sistema. O resultado serão as partes que integradas formarão o robô.

Original - Início: Novembro 2013, Duração: 6 Meses





Atualizado - Início: Fevereiro 2014, Duração: 12 Meses

Razão - O processo de aquisição de material permanente só teve início após a resolução do problema de alinhamento administrativo entre a ESBR e a UFRJ, logo o pacote de trabalho só teve início em Fevereiro 2014. A duração do pacote de trabalho será de 12 meses ao invés de 3 meses, pois:

O sector de compras da fundação COPPETEC entrou em processo de auditoria e permaneceu fechado por ?? Meses.

Erro na estimativa do tempo de entrega dos materiais planejados para o projeto, tempo máximo previsto de 3 meses, tempo estimado pelo fabricante 6 meses.

O processo de manufatura é dependente da tarefa design que sofreu atrasos (item 2.2).

2,4) Software: Desenvolvimento de drivers, controladores e comunicação para o hardware do robô. O resultado será uma biblioteca de componentes do software.

Original - Início: Fevereiro 2014, Duração: 3 Meses

Atualizado - Início: Janeiro 2014, Duração: 10 Meses

Razão - A tarefa teve seu início adiantado e sofreu uma alteração no prazo de duração, pois:

O desenvolvimento dos drivers para os sensores e algoritmos de processamento do sonar são dependentes da entrega do equipamento, logo dependente da tarefa Aquisição (item 2.3) que se encontra atrasada.

A complexidade de se integrar o software de representação volumétrica (octomap) ao framework de robótica escolhido como plataforma foi subestimada na estimativa inicial do projeto.

A complexidade da tarefa de processamento de dados sonar foi subestimada na estimativa inicial do projeto.

2,5) - Integração e Teste: Os componentes eletrônicos, mecânicos e de software serão integrado no sistema Viga Pescadora Inteligente. Este pacote de trabalho também inclui a instalação e teste do sistema.

Original - Início: Maio 2014, Duração: 5 Meses

Atualizado - Início: Junho 2014, Duração: 9 Meses

Razão - A tarefa é dependente das tarefas Aquisição e Manufatura (item 2.3) e Software (2.4) que se encontram atrasadas, logo a mesma sofreu atrasos equivalentes em sua execução.

4.3 Sistemas de Superfície

3) Sistemas de Superfície: Este elemento inclui o hardware e o software necessários para a operação do robô na superfície, incluindo a concepção, desenvolvimento, implementação e integração da comunicação, interface e gerência de dados.





3,1) Análise de Usuário: Análise dos potenciais usuário do sistemas. Este pacote de trabalho vai resultar em um documento que define: O que o usuário espera do sistema. Como o sistema irá fazer parte do dia a dia da operação. Qual é a capacitação técnica do futuro usuário. Qual aparência de interface têm um maior apelo para o usuário.

Original - Início: Outubro 2013, Duração: 1,5 Meses

Atualizado - Início: Novembro 2013, Duração: 1,5 Meses

- **Razão** Devido a atrasos administrativos internos, a equipe do projeto só foi contratada para trabalhar no projeto a partir do dia 18 de Novembro de 2013 o que resultou em um atraso equivalente para o início da execução do pacote de trabalho
- **3,2) Especificação de Hardware e Aquisição:** Este pacote de trabalho inclui a especificação e aquisição do equipamento necessário para operar o robô a partir da superfície. O resultado é um lista de componentes, e respectivos fabricantes, a serem comprados para o projeto.

Original - Início: Novembro 2013, Duração: 2 Meses

Atualizado - Início: Janeiro 2014, Duração: 2 Meses

- **Razão** A tarefa precisa ser postergada, pois a execução deste pacote de trabalho é dependente da conclusão da tarefas Análise de Usuário (item 3.1) que sofreu atrasos.
- **3,3) Protótipo de Interface e Teste:** Desenvolvimento de telas interativas simples, sem conteúdo, concentrando apenas no desenvolvimento da parte visual da interface. Estes protótipo de interface vai ser testado com os futuros usuário dos sistema e o resultado da sensação da mesma será avaliada.

Original - Início: Janeiro 2014, Duração: 3 Meses

Atualizado - Início: Marco 2013, Duração: 3 Meses

- **Razão** A tarefa precisa ser postergada, pois a execução deste pacote de trabalho é dependente da conclusão da tarefas Especificação de Hardware e Aquisição (item 3.2) que sofreu atrasos.
- **3,4) Interface de Usuário:** Implementação da interface de usuário (GUI) do robô, o que permite a visualização e o seu controle. O resultado será um software.

Original - Início: Abril 2014, Duração: 6 Meses

Atualizado - Início: Junho 2014, Duração: 6 Meses

Razão - A tarefa precisa ser postergada, pois a execução deste pacote de trabalho é dependente da conclusão da tarefas Protótipo de Interface e Teste (item 3.3) que teve seu início postergado.





5 Financeiro

O relatório financeiro aqui apresentado têm como objetivo demonstrar o que foi estimado no início do projeto, o que foi até o momento executado e a previsão atual do desenbolso necessário até o fim do projeto, fornecendo uma visão global do plano financeiro do projeto. Logo, as informações contidas neste relatório serão diferentes das informações contidas no relatório financeiro de prestação de contas, o qual detalha apenas os lançamentos realizados na conta do projeto até a data de fechamento do mês. Por favor, notar que existem itens detalhados como executados neste relatório que não estarão presentes na prestação de contas. Isto ocorre devido a defasagem de tempo entre a decisão de comprar o item e a data de pagamento da nota fiscal. Por mais, todos as informações presentes em ambos os relatórios deverão ser consistentes e em caso de inconsistência o valor relatado no relatório de prestação de contas dever ser considerado como o correto.






5.1 Desembolso

Desembolso Original vs Atual

			esembolso	D	esembolso			
	Rúbricas	Pre	Previsto Original I		Previsto Original Previsto Atual		evisto Atual	%
RH	Recursos Humanos	R\$	1.027.409,64	R\$	969.092,81	94%		
ST	Serviços de Terceiros	R\$	700.000,00	R\$	440.780,76	63%		
MC	Material de Consumo	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	100%		
MP	Material Permanente	R\$	1.972.875,00	R\$	1.272.875,00	65%		
VD	Viagens e Diáriais	R\$	158.160,00	R\$	123.245,10	78%		
OU**	<u>Outros</u>	R\$	503.273,41	R\$	331.506,17	66%		
Total	Total	R\$	4.364.218,05	R\$	3.139.999,84	72%		

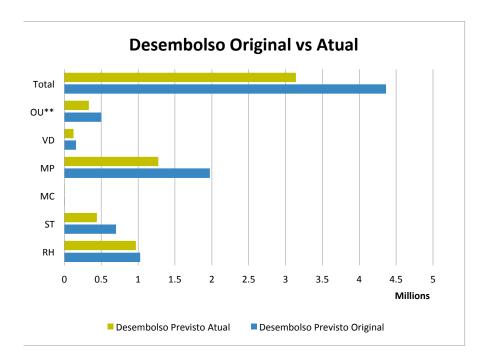





5.2 Recursos humanos

Recursos Humanos (RH)

Executado						
Nome	CPF	Oct-14	Nov-13	Dec-13	Jan-14	
Alana Monteiro Lima	147.881.217-60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gabriel Alcantara Costa Silva	136.759.937-79	R\$ 0,00	R\$ 4.869,44	R\$ 10.924,93	R\$ 12.110,75	
Eduardo Elael Soares	045.287.677-08	R\$ 0,00	R\$ 4.869,44	R\$ 10.924,93	R\$ 12.110,75	
Julia Ramos Campana	102.517.697-98	R\$ 0,00	R\$ 5.742,60	R\$ 12.939,93	R\$ 14.273,52	
Renan Salles de Freitas	129.325.817-24	R\$ 0,00	R\$ 4.869,44	R\$ 10.924,93	R\$ 12.110,75	
Alessandro Jacoud Peixoto	028.503.687-41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	
André Abido Figueiró	124.207.057-50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	
	Total	R\$ 0,00	R\$ 20.350,92	R\$ 52.582,72	R\$ 57.473,77	

	Executado							
Nome	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14				
Alana Monteiro Lima	R\$ 0,00	R\$ 18.832,47	R\$ 6.089,08	R\$ 6.119,60				
Gabriel Alcantara Costa Silva	R\$ 12.076,44	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.087,23				
Eduardo Elael Soares	R\$ 12.076,44	R\$ 11.853,23	R\$ 12.070,43	R\$ 12.087,23				
Julia Ramos Campana	R\$ 14.254,57	R\$ 13.991,76	R\$ 14.249,19	R\$ 14.266,09				
Renan Salles de Freitas	R\$ 12.075,71	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.087,23				
Alessandro Jacoud Peixoto	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00				
André Abido Figueiró	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00				
Total	R\$ 57.351,16	R\$ 75.686,32	R\$ 63.417,56	R\$ 63.515,38				

Previsto						
Nome	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14		
Alana Monteiro Lima	R\$ 6.089,08	R\$ 6.089,08	R\$ 6.089,08	R\$ 6.089,08		
Gabriel Alcantara Costa Silva	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43		
Eduardo Elael Soares	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43		
Julia Ramos Campana	R\$ 14.249,19	R\$ 14.249,19	R\$ 14.249,19	R\$ 14.249,19		
Renan Salles de Freitas	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43		
Alessandro Jacoud Peixoto	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00		
André Abido Figueiró	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00		
Total	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56		

Extensao					
Nome	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15
Alana Monteiro Lima	R\$ 6.089,08	R\$ 6.089,08	R\$ 6.089,08	R\$ 6.515,32	R\$ 6.515,32
Gabriel Alcantara Costa Silva	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.915,36	R\$ 12.915,36
Eduardo Elael Soares	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.915,36	R\$ 12.915,36
Julia Ramos Campana	R\$ 14.249,19	R\$ 14.249,19	R\$ 14.249,19	R\$ 15.246,63	R\$ 15.246,63
Renan Salles de Freitas	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.070,43	R\$ 12.915,36	R\$ 12.915,36
Alessandro Jacoud Peixoto	R\$ 5.200,00				
André Abido Figueiró	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	R\$ 1.688,00	R\$ 1.688,00
Total	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	R\$ 67.396,03	R\$ 67.396,03

 Executado
 R\$ 390.377,83

 Previsto
 R\$ 253.670,24

 Extensao
 R\$ 325.044,74

 Estimado
 R\$ 1.027.409,64

 Balanco
 R\$ 58.316,83





5.3 Serviços de terceiros

Serviço de Terceiros (ST)

Estimado					
ST-E	ITEM	Quant	Total (R\$)	Status	
1	Obras para instalação da equipe de pesquisa	1	R\$ 80.000,00	cancelado	
2	Confecção de partes mecânicas	2	R\$ 10.000,00	previsto	
3	Desenvolvimento de Software	1	R\$ 610.000,00	contratado	

Executado				
ST-C	ITEM	Quant	Total (R\$)	Data
1	Desenvolvimento de Software	1	R\$ 225.780,76	Maio-14

	Previsto					
ST-P	ITEM	Quant	Total (R\$)	Data		
1	Design Mecanico	1	R\$ 205.000,00	Julho-14		
2	Confecção de partes mecânicas vao de pressa	1	R\$ 5.000,00	Julho-14		
3	Confecção de partes mecânicas (adaptador so	1	R\$ 5.000,00	Agosto-14		

Estimado	R\$ 700.000,00
Executado	R\$ 225.780,76
Previsto	R\$ 215.000,00
Total	R\$ 259.219,24

	Observacoes					
Ref	ITEM	Detalhamento				
ST-E-1	Obras para instalação da equipe de pesquisa	nao haverá necessidade de obras para instalar a equipe				
ST-C-1	Desenvolvimento de Software	A empresa CIR foi contratada para execução do serviço de desenvolvimento Software				
ST-P-1	Design Mecanico	era estimado a participação de um engenheiro mecânico na equipe de pesquisa do projeto, entretanto não foi encontrado candidato com as qualificações necessárias, logo a necessidade de se contratar uma empresa para desenvolvimento dos design mecânicos				





5.4 Material de consumo

Material de Consumo (MC)

Estimado				
MC-E-	ITEM	Quant	Total (R\$)	Status
1	Material IT	-	R\$ 500,00	previsto
2	Consumo de Eletrônica e Mecânica	-	R\$ 2.000,00	comprado

	Executado			
MP-C-	ITEM	Quant	Total (R\$)	Data
1	Equipamentos Elétricos	-	R\$ 766,35	Maio-14
2	Carregador Kita e Bateria Power	-	R\$ 270,00	Maio-14
3	Multicabo 12X24	-	R\$ 494,00	Maio-14
4	Chave Gangorra	-	R\$ 30,10	Maio-14
5	Regulador, CAP. Poliester, Barra Sindal, Barra de pino, Adaptador tomada e Extensão	-	R\$ 84,00	Maio-14

Previsto				
MP-P-	ITEM	Quant	Total (R\$)	Data
1	Material IT	-	R\$ 500,00	Jun-14
2	Consumo de Eletrônica e Mecânica	-	R\$ 355,55	Jun-14

Estimado	R\$ 2.500,00
Executado	R\$ 1.644,45
Previsto	R\$ 855,55
Total	R\$ 0,00





5.5 Material permanente

Material Permanente (MP)

	Estimado					
MP-E-	ITEM	Quant	Total (R\$)	Status		
1	Camera submarina	2	R\$ 336.600,00	cancelado		
2	Sensores de contato	4	R\$ 257.400,00	comprado		
3	Proteção para câmera e sonar	1	R\$ 123.750,00	cancelado		
4	Sonar 3D	1	R\$ 396.000,00	comprado		
5	Umbilical	1	R\$ 4.950,00	previsto		
6	Casco para eletrônica embarcada	1	R\$ 366.300,00	previsto		
7	Eletrônica para veículos submarinos	1	R\$ 410.850,00	previsto		
8	Bomba submarina	2	R\$ 29.700,00	previsto		
9	Computadores	3	R\$ 9.000,00	comprado		
10	Tablet	1	R\$ 17.325,00	comprado		
11	Ferramentas	1	R\$ 4.000,00	previsto		
12	Caixas de Material	10	R\$ 5.000,00	previsto		
13	Servidor para gerência e armazenamento de dados	1	R\$ 12.000,00	previsto		

Executado				
MP-C-	ITEM	Quant	Total (R\$)	Data
1	Sensor Indutivo	3	R\$ 379,03	abr-14
2	Cabos sensor indutivos	3	R\$ 185,61	abr-14
3	Encoder	3	R\$ 3.589,61	mai-14
4	Pan & Tilt	1	R\$ 39.358,18	-
5	Sonar (Profiled Super Seaking)	1	R\$ 41.904,16	mar-14
6	Notebooks Dell	3	R\$ 9.298,39	abr-14
7	Tablet Samsung	1	R\$ 1.583,12	abr-14
8	Sensor de Pressao	1	R\$ 1.625,50	mai-14

Previsto					
MP-P-	ITEM	Quant	Total (R\$)	Data	
1	Eletrônica embarcada com casco e umbilical (50% upfront)	1	R\$ 507.276,00	Jun-14	
1	Eletrônica embarcada com casco e umbilical (50% delivery	1	R\$ 507.276,00	Out-14	
2	Eletronica embarcada protótipo	1	R\$ 0,00	Jun-14	
3	Bomba submarina	2	R\$ 29.700,00	Jul-14	
4	Caixas de Material	10	R\$ 5.000,00	Jul-14	
5	Servidor para gerência e armazenamento de dados	1	R\$ 12.000,00	Ago-14	

Estimado	R\$ 1.972.875,00
Executado	R\$ 97.923,60
Previsto	R\$ 1.061.252,00
Total	R\$ 813.699,40





5.6 Viagens e diárias

Viagens e Diarias (VD)

	Estimado				
VD-E	ITEM	Total (R\$)	Status		
1	Análise inicial do problema	R\$ 15.400,00	Executado		
2	Teste de campo 1	R\$ 15.400,00	Previsto		
3	Teste de campo 2	R\$ 15.400,00	Previsto		
4	Teste de campo 3	R\$ 15.400,00	Previsto		
5	Teste de campo 4	R\$ 15.400,00	Previsto		
6	Capacitação Exterior	R\$ 7.790,00	Cancelado		
7	Capacitação Exterior	R\$ 7.790,00	Previsto		
8	Workshop 1	R\$ 7.790,00	Previsto		
9	Workshop 2	R\$ 7.790,00	Previsto		
10	Viagem Nacional	R\$ 25.000,00	Previsto		
11	Viagem Nacional	R\$ 25.000,00	Previsto		

Executado				
VD-C	ITEM	Total (R\$)	Data	
1	Análise inicial do problema	R\$ 0,00	-	
1	Teste de Campo 1	R\$ 15.665,10	mai-14	

	Previsto				
VD-P	ITEM	Total (R\$)	Data		
1	Teste de campo 2	R\$ 15.400,00	Ago-14		
2	Apresentacao Paper Nacional	R\$ 5.000,00	Out-14		
3	Capacitação Exterior	R\$ 0,00	-		
4	Teste de campo 3	R\$ 15.400,00	Nov-14		
5	Apresentacao Paper Internacio	R\$ 7.790,00	Nov-14		
6	Apresentacao Paper Nacional	R\$ 5.000,00	Dez-14		
7	Teste de campo 4	R\$ 15.400,00	Jan-15		
8	Apresentacao Paper Internacio	R\$ 7.790,00	Jan-15		
9	Apresentacao Paper Nacional	R\$ 5.000,00	Jan-15		
10	Teste de campo 5	R\$ 15.400,00	Feb-15		
11	Viagens revisao Administrativa	R\$ 15.400,00	Feb-15		

Balanco R\$	
Previsto R\$	107.580,00
Executado R\$	15.665,10
Estimado R\$	158.160,00





5.7 Outros

Outros (OU)

Estimado							
OU-E	ITEM	Total (R\$)	Status				
1	Impressão e Encadernação Documentos	R\$ 300,00	previsto				
2	Inscrição em Eventos	R\$ 6.600,00	previsto				
3	Despesas com patentes	R\$ 6.000,00	previsto				
4	Despesas de importação	R\$ 50.000,00	previsto				
5	Vídeo / material promocional com animação 3D	R\$ 25.000,00	previsto				
6	Despesa operacionais de custos indivisíveis	R\$ 198.177,78	contratado				
7	Taxa de Mobilizacao de Infraestrutura	R\$ 115.200,00	contratado				
8	ISS	R\$ 87.284,36	contratado				
9	Seguro de vida	R\$ 1.800,00	pago				
10	Auxilio Moradia para bolsista no exteriro	R\$ 7.920,00	previsto				
11	Plano saúde internacional para bolsa no exteriror	R\$ 3.240,00	previsto				
12	Seguro do Servidor e Laptops	R\$ 1.751,00	previsto				

	Contratado								
OU-C	ITEM	Total (R\$)	Data						
1	Taxa de Mobilizacao de Infraestrutura	R\$ 115.200,00	mar-14						
2	Seguro de vida	R\$ 677,88	jun-76						
3	ISS NF 214313	R\$ 39.273,65	mar-14						
4	Taxa de Admnistracao (Fundacao Coppetec - DOA)	R\$ 86.551,79	mar-14						
5	Publicacao Diário Oficial	R\$ 151,85	abr-14						

	Previsto		
OU-P	ITEM	Total (R\$)	Data
1	Impressão e Encadernação Documentos	R\$ 300,00	Jan-15
2	Inscrição em Eventos	R\$ 6.600,00	Out-14
3	Despesas com patentes	R\$ 6.000,00	Jan-15
4	Despesas de importação	R\$ 50.000,00	Jul-14
5	Vídeo / material promocional com animação 3D	R\$ 25.000,00	Ago-14
6	Taxa de Admnistracao (Fundacao Coppetec - DOA)	R\$ 58.905,87	-
8	ISS	R\$ 24.740,46	-
10	Auxilio Moradia para bolsista no exteriro	R\$ 0,00	-
11	Plano saúde internacional para bolsa no exteriror	R\$ 0,00	-
12	Seguro do Servidor e Laptops	R\$ 1.751,00	Ago-14

R\$ 88.120,63
R\$ 173.297,33
R\$ 241.855,17
R\$ 503.273,14






5.8 Balanço

Desembolso (Realizado) vs Despesas (Realizadas)

		F	Realizado		Despesas			
	Rúbricas	(De	esembolso)	((Alocadas)	%	% Balanço do Proje	
RH	Recursos Humanos	R\$	342.469,88	R\$	390.377,83	114%	-R\$	47.907,95
ST	Serviços de Terceiros	R\$	30.000,00	R\$	225.780,76	753%	-R\$	195.780,76
MC	Material de Consumo	R\$	2.500,00	R\$	1.644,45	66%	R\$	855,55
MP	Material Permanente	R\$	1.272.875,00	R\$	97.923,60	8%	R\$	1.174.951,40
VD	Viagens e Diáriais	R\$	30.980,00	R\$	15.665,10	51%	R\$	15.314,90
OU**	<u>Outros</u>	R\$	283.057,58	R\$	241.855,17	85%	R\$	41.202,41
Total	Total	R\$	1.961.882,46	R\$	973.246,91	50%	R\$	988.635,55

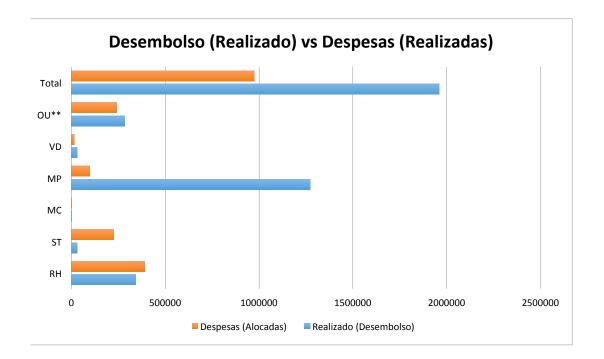





5.9 Cronograma

	Balanco							
	Maio-14	Jun-14	Jul-14	Ago-14	Set-14	Out-14		
RH	-R\$ 47.907,95	-R\$ 111.325,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
ST	-R\$ 195.780,76	-R\$ 195.780,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
мс	R\$ 855,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
MP	R\$ 1.174.951,40	R\$ 667.675,40	R\$ 632.975,40	R\$ 620.975,40	R\$ 620.975,40	R\$ 113.699,40		
VD	R\$ 15.314,90	R\$ 15.314,90	R\$ 15.314,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
OU**	R\$ 41.202,41	R\$ 41.202,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total	R\$ 988.635,55	R\$ 417.086,44	R\$ 648.290,30	R\$ 620.975,40	R\$ 620.975,40	R\$ 113.699,40		

Desepesas Previstas							
	Maio-14	Jun-14	Jul-14	Ago-14	Set-14	Out-14	
RH	R\$ 0,00	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	
ST	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
мс	R\$ 0,00	R\$ 855,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MP	R\$ 0,00	R\$ 507.276,00	R\$ 34.700,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 507.276,00	
VD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
OU**	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 26.751,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	
Total	R\$ 0,00	R\$ 571.549,11	R\$ 358.117,56	R\$ 122.568,56	R\$ 63.417,56	R\$ 582.293,56	

	Desenbolso						
	Maio-14	Jun-14	Jul-14	Ago-14	Set-14	Out-14	
RH	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.743,07	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56	
ST	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.780,76	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,10	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
OU**	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.797,59	R\$ 26.751,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	
TM*	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TA*	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.466,07	R\$ 4.762,68	R\$ 3.170,88	R\$ 3.750,88	
IP*	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.375,75	R\$ 2.000,33	R\$ 1.331,77	R\$ 1.575,37	
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631.163,24	R\$ 102.016,67	R\$ 67.920,21	R\$ 80.343,81	





			Balanco		
	Total	Feb-15	Jan-15	Dey-14	Nov-14
RH	R\$ 0,00				
ST	R\$ 0,00				
MC	R\$ 0,00				
MP	R\$ 113.699,40				
VD	R\$ 0,00				
OU**	R\$ 0,00				
Tota	R\$ 113.699,40				

		stas	Despesas Previs	I	
	Total	Feb-15	Jan-15	Dey-14	Nov-14
RH	R\$ 578.714,98	R\$ 67.396,03	R\$ 67.396,03	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56
ST	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC	R\$ 855,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MP	R\$ 1.061.252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VD	R\$ 107.580,00	R\$ 30.800,00	R\$ 28.190,00	R\$ 5.000,00	R\$ 23.190,00
OU**	R\$ 89.651,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tota	R\$ 2.053.053,53	R\$ 98.196,03	R\$ 101.886,03	R\$ 68.417,56	R\$ 86.607,56

)	Desenbols		
	Total	Feb-15	Jan-15	Dey-14	Nov-14
3 RH	R\$ 626.622,93	R\$ 67.396,03	R\$ 67.396,03	R\$ 63.417,56	R\$ 63.417,56
6 ST	R\$ 410.780,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0 MC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0 MP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0 VD	R\$ 92.265,10	R\$ 30.800,00	R\$ 28.190,00	R\$ 5.000,00	R\$ 23.190,00
9 ou *	R\$ 48.448,59	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0 TM *	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 TA *	R\$ 58.905,87	R\$ 4.909,80	R\$ 5.094,30	R\$ 3.420,88	R\$ 4.330,38
6 IP *	R\$ 24.740,46	R\$ 2.062,12	R\$ 2.139,61	R\$ 1.436,77	R\$ 1.818,76
1 Tota	R\$ 1.261.763.71	R\$ 105.167.95	R\$ 109.119.94	R\$ 73.275.21	R\$ 92.756.70

